


**Universidad Tecnológica Nacional**  
**Facultad Regional Córdoba**  
**Ingeniería en Sistemas de Información**  
**Administración de Sistemas de Información**



**TEMA: SCRUM**

**Año: 2026**

**Docentes**

- Salvador Barbera
- Ing. Constanza Garnero
- Salvador Barbera

**Curso: 4K4**

**Grupo Nro: 4**

**Integrantes:**

- Alvaretto, Caterina - 95028
- Arrigo, Gaspar - 94135
- Amor, Ignacio - 89507
- Baigorria, Jesica Belen - 401824
- Basly, Agustin - 99238
- Botta Bernaus, Fabrizio - 79553
- Galera, Pedro - 90243
- Nasimbera Falco, Fabrizio Edgar - 96095
- Moyano Serra, Tomas - 96846
- Panamá, Matías Aarón - 95165
- Soldera Theaux, Federico - 79554
- Terreno Monla, Florencia Sofia - 90112

## *Índice*

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción.....</b>          | <b>2</b> |
| <b>2. Trabajo en Clase.....</b>      | <b>2</b> |
| <i>1er Sprint.....</i>               | <i>2</i> |
| <i>2do Sprint.....</i>               | <i>3</i> |
| <i>3er Sprint.....</i>               | <i>4</i> |
| <b>3. Sprint Burndown Chart.....</b> | <b>6</b> |
| <i>1er Sprint.....</i>               | <i>6</i> |
| <i>2do Sprint.....</i>               | <i>6</i> |
| <i>3er Sprint.....</i>               | <i>6</i> |
| <b>4. Conclusión.....</b>            | <b>7</b> |

# 1. Introducción

El presente trabajo práctico tiene como finalidad aplicar de manera práctica los conceptos, principios y lineamientos del framework Scrum. A través de esta actividad, nosotros como equipo asumimos el rol de una empresa de diseño encargada de desarrollar prototipos en miniatura de atracciones para un parque de diversiones, destinados a una reconocida empresa de entretenimiento de la ciudad de Córdoba.

Para la realización de los prototipos se utilizaron materiales de de bajo costo y fácil acceso, como cartulinas, palitos de madera, sorbetes, cajas y otros elementos de papelería, simulando un entorno de desarrollo en el que se aplican las prácticas de Scrum para gestionar el trabajo y la entrega incremental de valor.

Durante la realización del práctico, el equipo debe llevar a cabo las principales ceremonias y actividades del framework, incluyendo la priorización y planificación de los sprints, la ejecución de las tareas comprometidas, las reuniones diarias de seguimiento (Daily Scrum), las revisiones de sprint (Sprint Review) y las retrospectivas (Sprint Retrospective).

Las funcionalidades del producto se representan mediante historias de usuario asociadas a diferentes atracciones del parque, tales como la rueda de la fortuna, los autos chocadores, la casa del terror, la montaña rusa, las hamacas y la calesita. Al finalizar cada sprint, las atracciones desarrolladas son sometidas a una revisión para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad y seguridad establecidos, aceptándose únicamente aquellas que satisfacen los criterios definidos.

## 2. Trabajo en Clase

### *1er Sprint*

Durante la planificación del primer Sprint, el equipo acordó trabajar en cuatro atracciones: la rueda de la fortuna, la montaña rusa, los autos chocadores y la casa del terror. Con el objetivo de avanzar en paralelo y aprovechar mejor el tiempo disponible, se distribuyeron las tareas entre los integrantes del grupo, asignando responsables para cada prototipo.

Debido a la complejidad de construcción de algunas atracciones, especialmente la rueda de la fortuna y la montaña rusa, se estimó que probablemente no podrían completarse dentro de una única iteración. Por ello, se planteó como meta finalizar los autos chocadores y avanzar significativamente en el resto de los prototipos.

### *Daily Scrum Meetings:*

- 1ra Daily:
  - Rueda de la fortuna → Se definió el diseño general, que materiales se iban a necesitar y se inició la construcción de la estructura principal.
  - Montaña rusa → Se definió cómo iba a ser la estructura, su funcionamiento y que materiales se iban a necesitar. También se terminó con el eslabón más bajo de la montaña.
  - Autitos chocadores → Se definieron los materiales y se construyó el primer prototipo de los autos.



- Casa del terror → Se preparó la caja principal y se definieron los elementos decorativos a incorporar.
- 2da Daily
  - Rueda de la fortuna → Se avanzó en el armado de la rueda y en el mecanismo para que la rueda pueda girar.
  - Montaña rusa → Se avanzó con el eslabón más alto y el eslabón del medio.
  - Autitos chocadores → Se avanzó con la base y su decoración
  - Casa del terror → Se preparó la base del prototipo y la estructura de una casa.
- 3ra Daily
  - Rueda de la fortuna → Se avanzó con la decoración de la rueda y la base del prototipo.
  - Montaña rusa → Se realizaron las uniones entre los eslabones.
  - Autitos chocadores → Se terminaron los últimos dos autitos y se unió la base con los autos.
  - Casa del terror → Se avanzó con la estructura de la última casa y se empezó con la decoración.

#### ***Resultado del Sprint:***

Al finalizar el Sprint, el equipo logró completar satisfactoriamente el prototipo de los autitos chocadores. Los prototipos de la rueda de la fortuna, la montaña rusa y la casa del terror quedaron parcialmente desarrollados, por lo que su construcción continuó en el siguiente Sprint.

#### ***2do Sprint***

Durante la planificación del segundo Sprint, el equipo acordó concentrar sus esfuerzos en completar las atracciones que habían quedado pendientes del Sprint anterior, aprovechando los avances ya realizados durante la iteración previa. Poniendo mayor esfuerzo en terminar el prototipo de la rueda de la fortuna y la montaña rusa.


#### ***Daily Scrum Meetings:***

- 1ra Daily
  - Rueda de la Fortuna → Se realizó la estructura que le va a dar soporte a la rueda
  - Montaña rusa → Se reforzó todas las uniones de la estructura de la montaña rusa
  - Casa del terror → Se recortaron todos los detalles decorativos y se forró las dos casas restantes
- 2da Daily
  - Rueda de la Fortuna → Se unieron la base que contiene la estructura con la rueda.
  - Montaña rusa → Se empezó la decoración de los eslabones y uniones de la montaña rusa
  - Casa del terror → Se terminó de decorar y unir las partes. También se anotó un nuevo requerimiento para el próximo sprint

- 3ra Daily
  - Rueda de la Fortuna → Se realizaron pruebas de funcionamiento y se ultimaron detalles estéticos.
  - Montaña rusa → Se finalizó con la decoración y se probó el funcionamiento con una canica.

#### ***Resultado del Sprint:***

Al finalizar el Sprint, el equipo logró completar satisfactoriamente los prototipos de la rueda de la fortuna, la montaña rusa y la casa embrujada. De esta manera, se alcanzó el objetivo propuesto para la iteración, finalizando todas las atracciones que habían quedado pendientes del Sprint anterior.

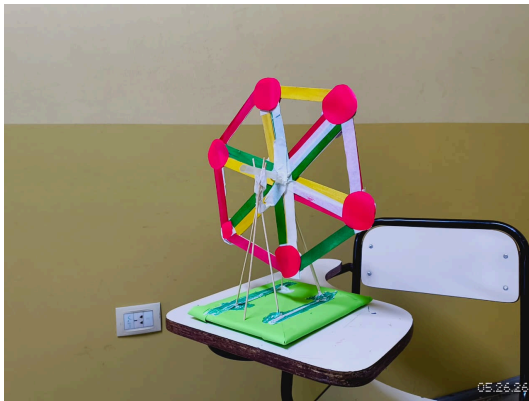

#### ***3er Sprint***

Durante la planificación del tercer Sprint, el equipo definió como objetivo completar las dos atracciones restantes del proyecto: las hamacas y la calesita. Asimismo, antes del inicio de la iteración se incorporó un nuevo requerimiento consistente en la elaboración de un mapa general del parque de diversiones, con el propósito de representar la ubicación de las distintas atracciones desarrolladas.


#### ***Daily Scrum Meetings:***

- 1ra Daily
  - Casa del terror → Se agregó la estrella del nuevo requerimiento
  - Hamacas → Se diseñó la estructura y se avanzó con la realización de la base
  - Calesita → Se diseñó la estructura y se realizaron los dibujos de los animales.
  - Mapa → Se realizó el boceto de los títulos y los espacios que ocuparían los dibujos

- 2da Daily
  - Hamacas → Se realizaron la estructura y las dos hamacas, para luego hacer la unión de las partes
  - Calesita → Se realizó la estructura y su decoración.
  - Mapa → Se avanzó con los borradores de cada atracción y sus respectivos nombres
- 3ra Daily
  - Calesita → Se unieron todas las partes y se realizaron las pruebas de funcionamiento del prototipo.
  - Mapa → Se repasaron todos los detalles finales con fibrón y se ultimaron detalles.

***Resultado del Sprint:***

Al finalizar el Sprint, el equipo logró completar satisfactoriamente los prototipos de las hamacas y la calesita. Además, se finalizó el mapa general del parque incorporando todas las atracciones desarrolladas durante el proyecto. De esta manera, se cumplieron todos los objetivos planificados para la iteración y se completaron los requerimientos del proyecto.

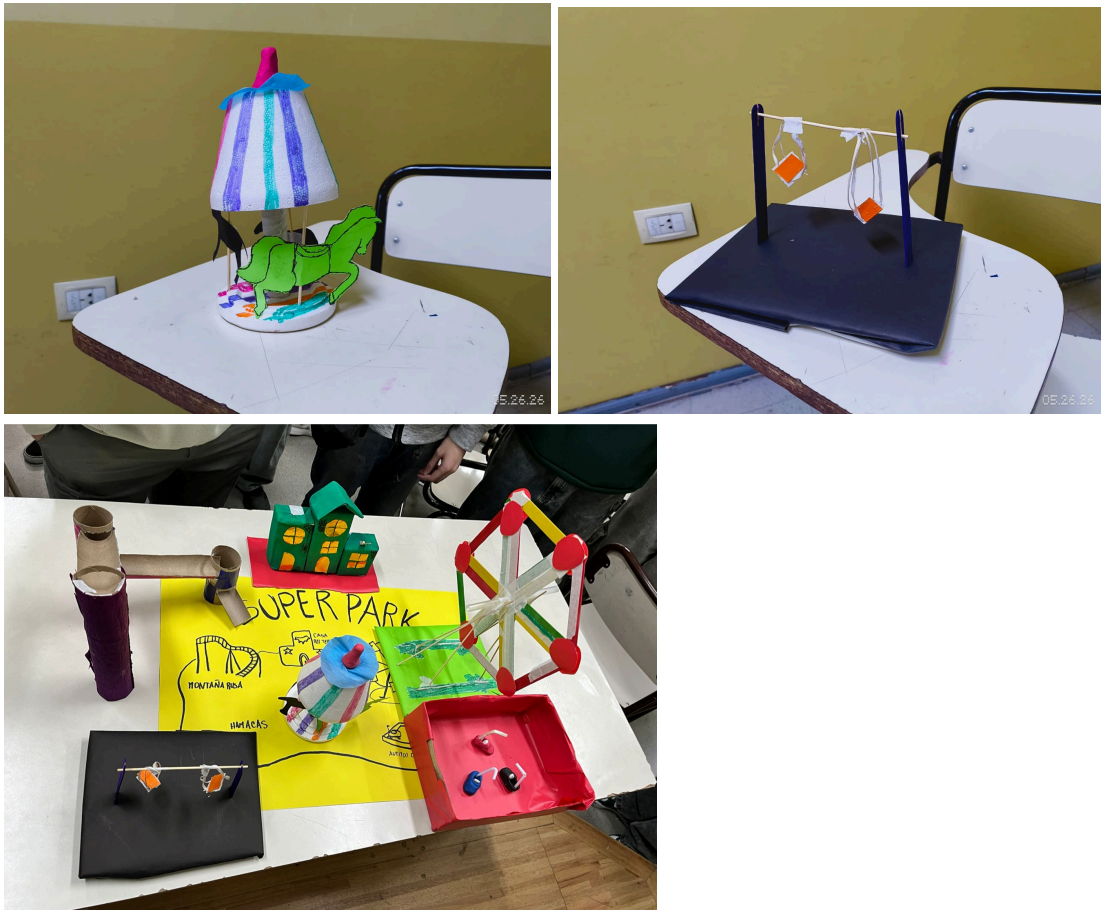


### 3. Sprint Burndown Chart

#### *1er Sprint*

En el primer Sprint se estimaron las historias de usuario de la siguiente forma:


- Rueda de la fortuna → 8 story points
- Montaña rusa → 5 story points
- Autitos Chocadores → 3 story points
- Casa del terror → 3 story points

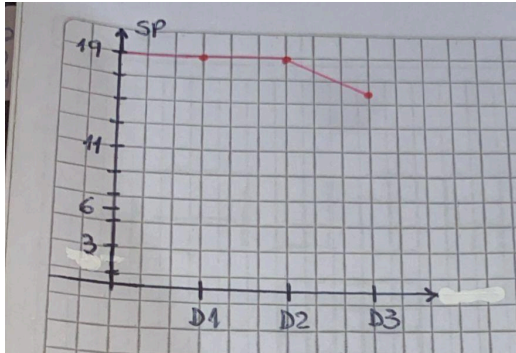

#### *2do Sprint*

En el segundo Sprint se estimaron las historias de usuario de la siguiente forma teniendo en cuenta el avance del Sprint anterior:


- Rueda de la Fortuna → 5 story points
- Montaña rusa → 3 story points
- Casa del terror → 2 story points

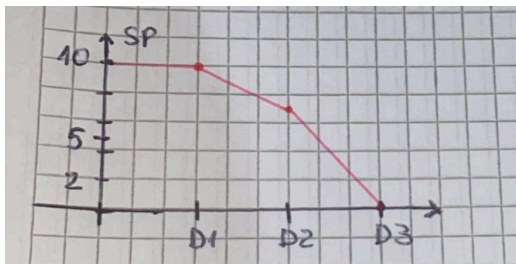

#### *3er Sprint*

En el tercer Sprint se estimaron las historias de usuario de la siguiente forma:

- Calesita → 5 story points
- Hamacas → 3 story points
- Mapa → 2 story points

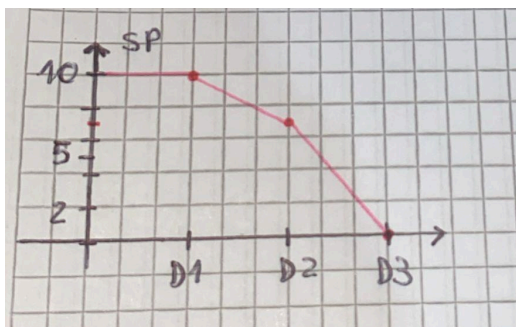

## 4. Conclusión

Este trabajo práctico nos permitió aplicar de manera concreta los conceptos y ceremonias del framework Scrum. A lo largo de los 3 Sprints aprendimos cómo organizar el trabajo, distribuir responsabilidades y realizar un seguimiento continuo del avance de cada parte del proyecto (cada prototipo).

Durante el primer sprint se nos presentaron algunas dificultades relacionadas con la planificación y la organización de las tareas, eligiendo objetivos muy altos para la capacidad del equipo. Sin embargo, a partir de las retroalimentaciones se pudo lograr una mejora y ajustar la forma de trabajo.

En los siguientes Sprints se logró una mejor organización, una distribución más productiva de las tareas y una mayor coordinación entre los integrantes del equipo. Esto permitió cumplir con los objetivos planificados y finalizar de forma satisfactoria todos los prototipos y requerimientos del proyecto.

En resumen, esta actividad resultó muy valiosa para experimentar de alguna forma todo el proceso que sigue SCRUM.

